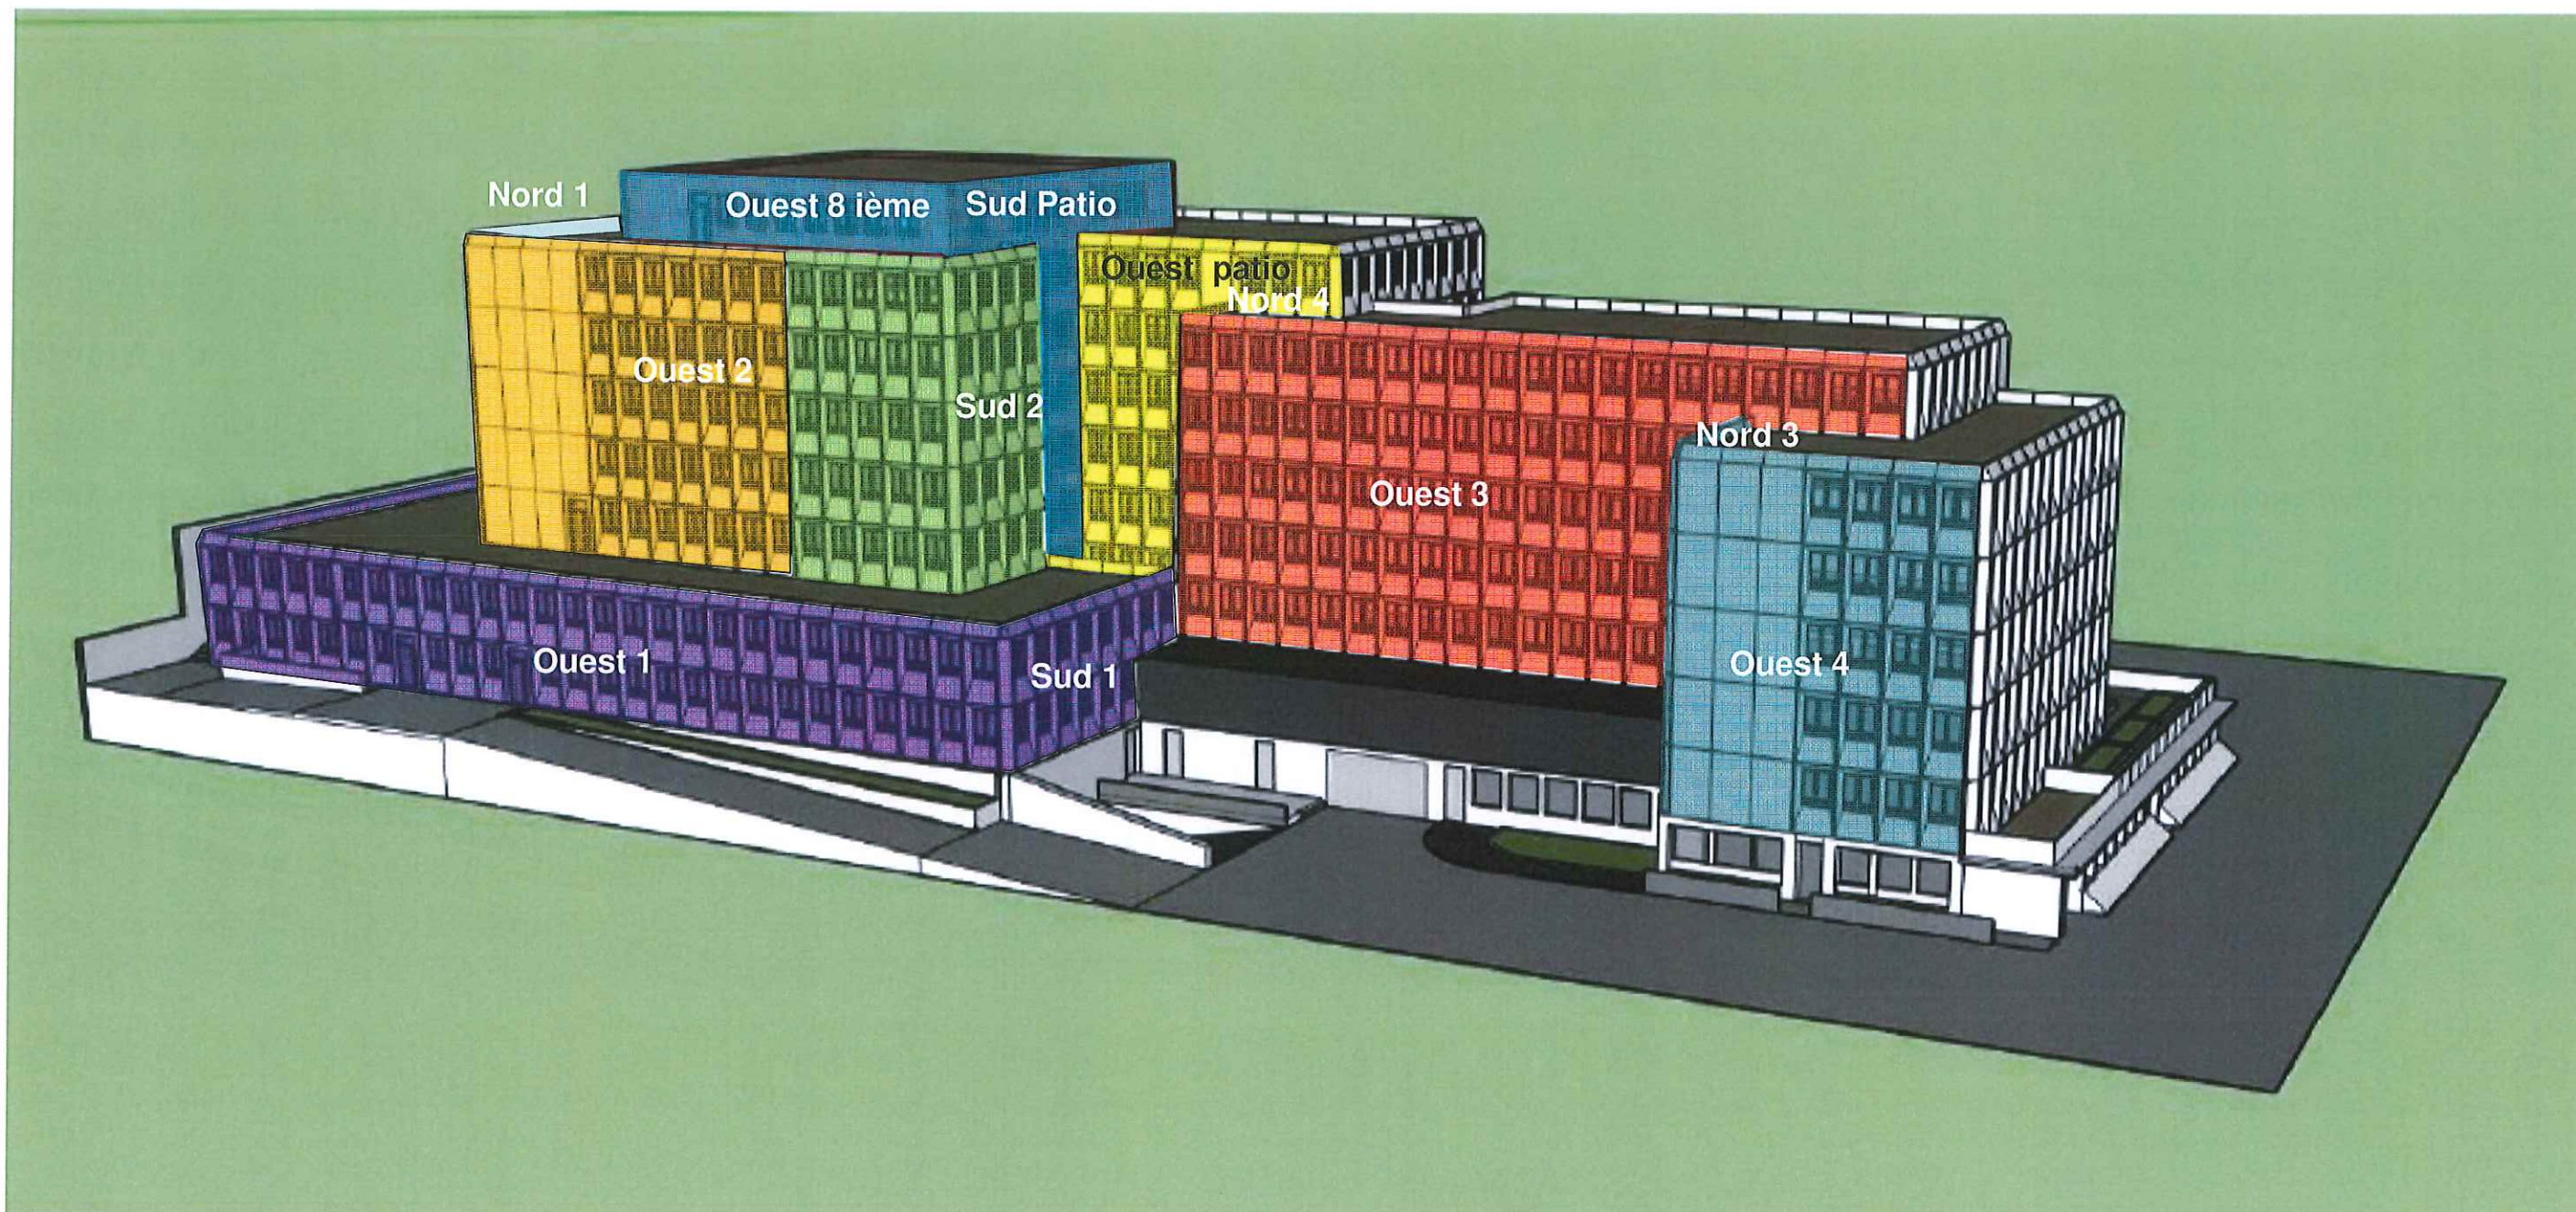


Zone 7 (Face Nord 1) 535 m²

Zone 8 (2/3 Face Ouest 2: 11 rangées panneaux) 342 m²

Zone 9 (Face Sud 2 +1/3 Face Ouest 2: 5 rangées panneaux) 291 m²

Zone 10 (Face Sud patio + Nord 6 8 ième+Est 4 8 ième + Ouest 8 ième) 420 m²

Zone 11 (Face Ouest 1+ Sud 1+Nord 2) 551 m²

Zone 12 (Face Nord 4 + Ouest patio + Est patio) 435 m²



Zone 13 (Face Ouest 3) 506 m²

Zone 14 (Face Ouest 4 + Nord 3) 365 m²



FREYSSINET

Direction Technique Opérationnelle
Service Corrosion

CENTRE DES FINANCES JOSEPH CADEI- NICE

Plan d'installation de la protection cathodique par courant imposé

Plan de distribution des zones 7 à 14

Rév 0


22/11/2018

Rédacteur: AM

vérifié par: EM

validé par: AM

Page 2/2

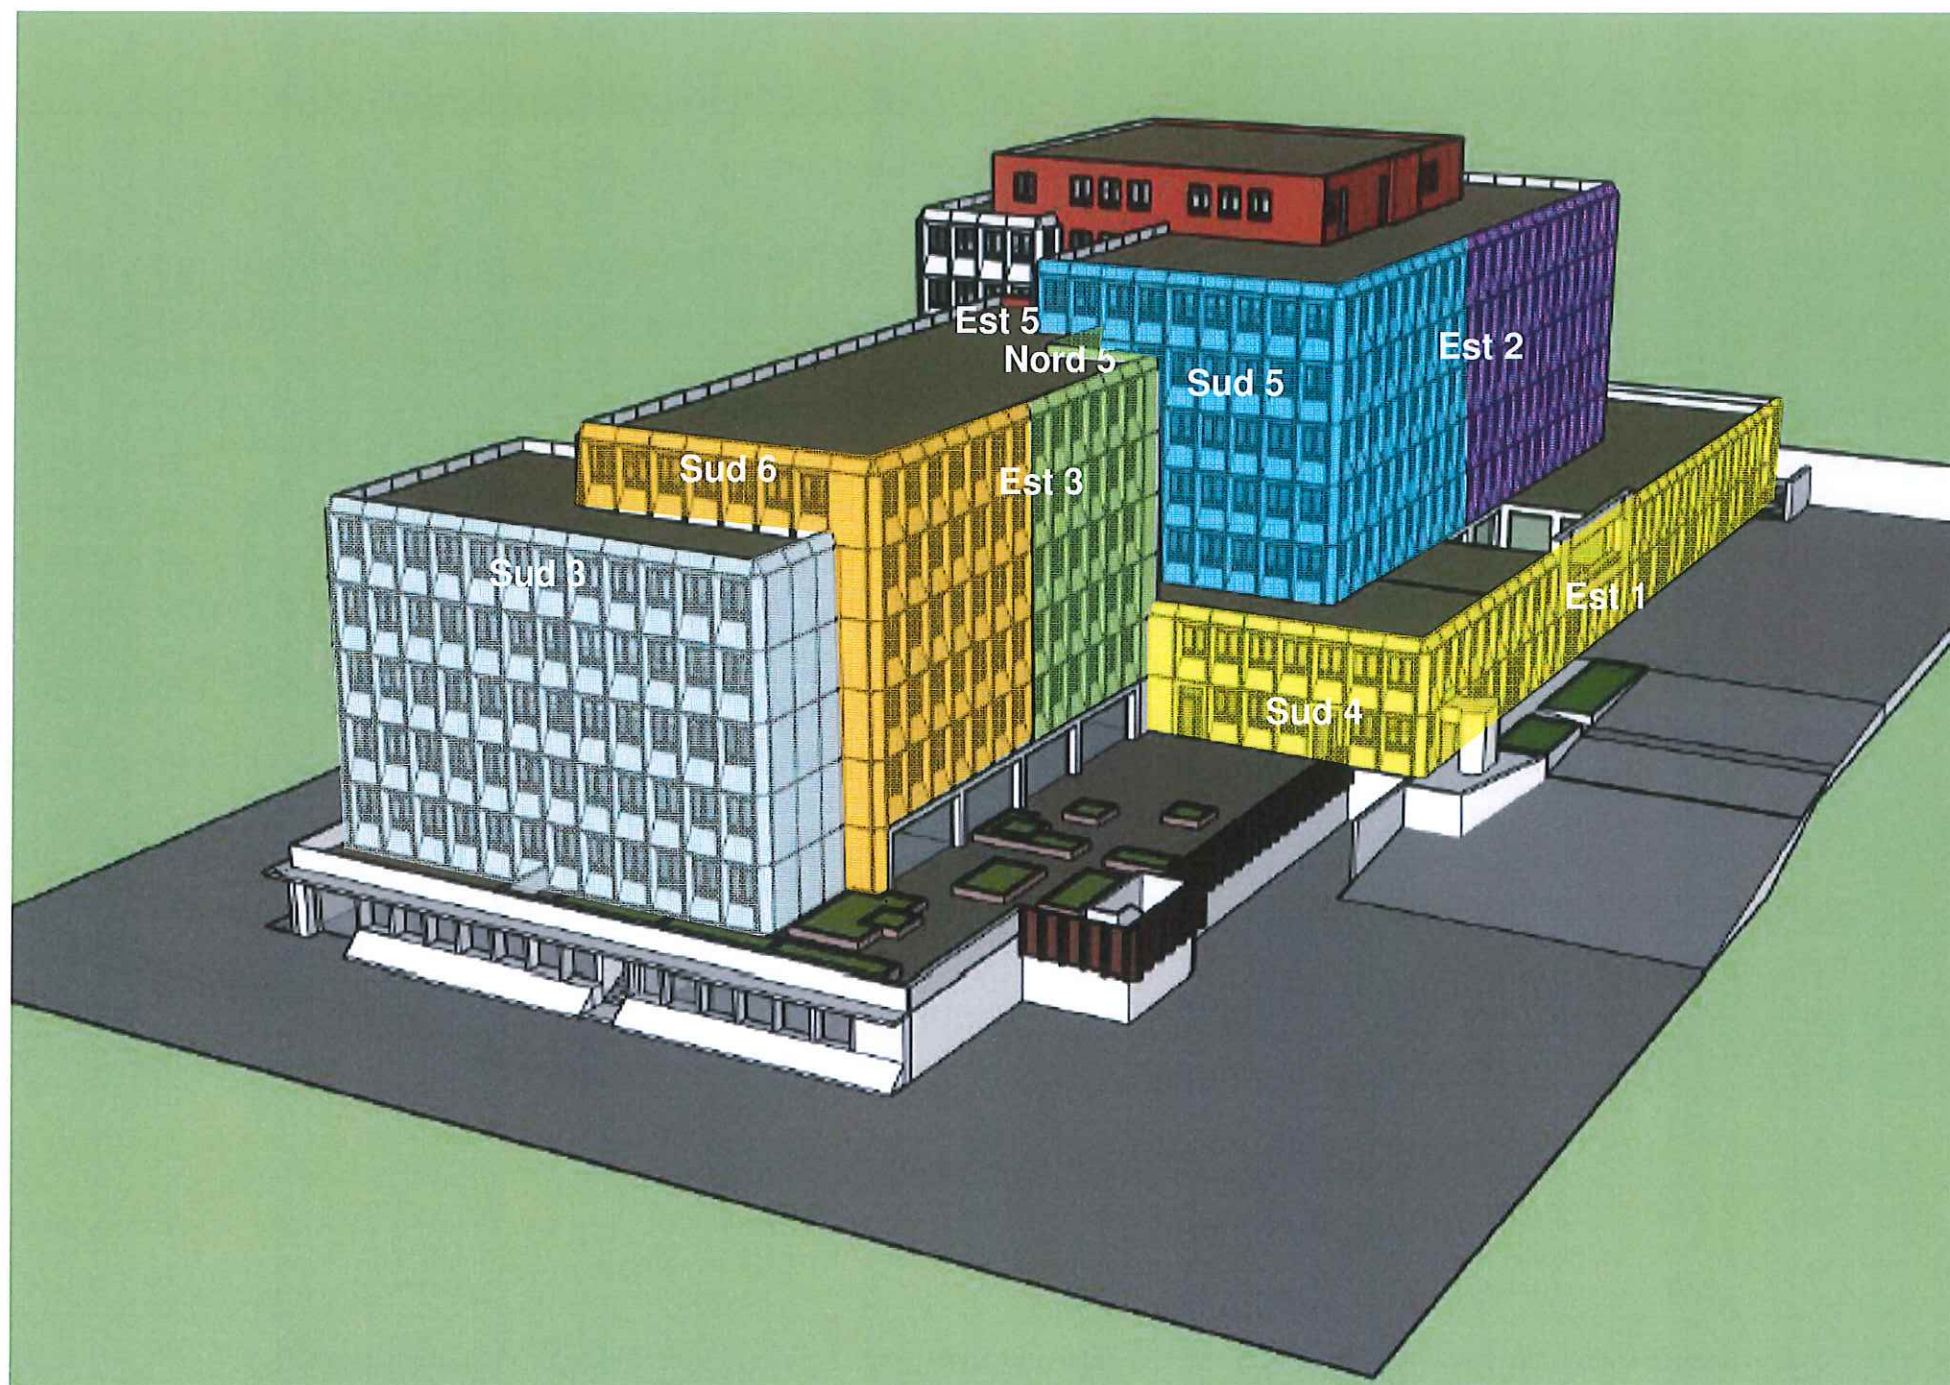

- Zone 1 (Face Sud 3 + mur plein Est 3) 480 m²
- Zone 2 (Face Sud 6 + 7 rangées panneaux Est 3) 320 m²
- Zone 3 (Face Nord 5 + 7 rangées panneaux Est 3) 340 m²
- Zone 4 (Face Sud 5 + 10 rangées panneaux Est 2) 505 m²
- Zone 5 (13 rangées panneaux Est 2) 390 m²
- Zone 6 (Face Sud 4 + Est 1) 461 m²



FREYSSINET

Direction Technique Opérationnelle
Service Corrosion

CENTRE DES FINANCES JOSEPH CADEI- NICE

Plan d'installation de la protection cathodique par courant imposé

Plan de distribution des zones 1 à 6


Rév 0

22/11/2018


Rédacteur:	AM
vérifié par:	EM
validé par:	AM

Page 1/2


OUEST 3 (façade Ouest)

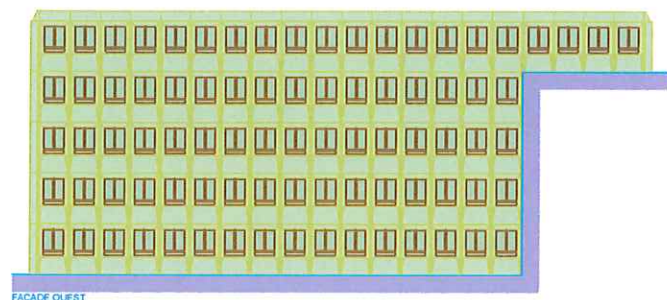


PHASE 1: 72 Jours +3 Jours rotation échafaudage




NORD 4 OUEST PATIO SUD PATIO EST 5

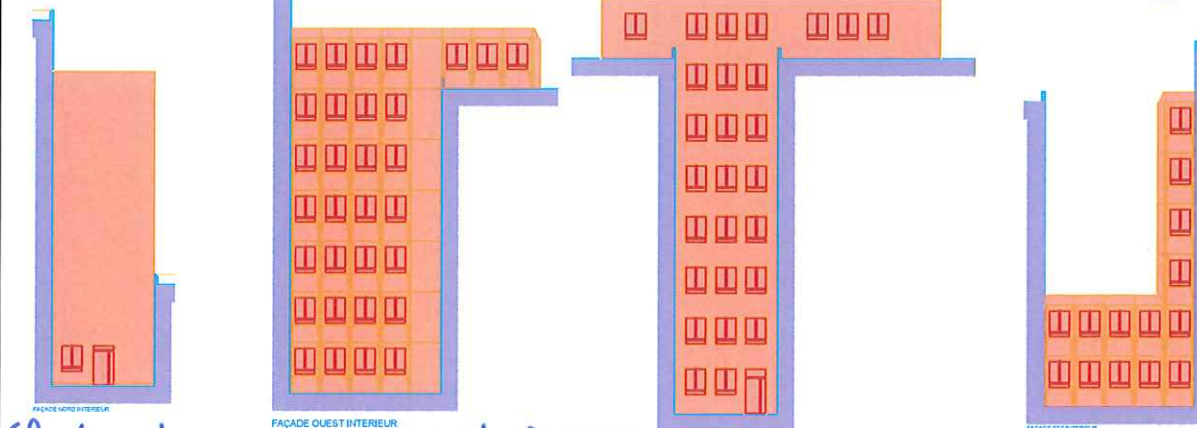


(façade Nord intérieur) (façade Ouest intérieur) (Sud intérieur) Est Intérieur
PHASE 2: 90 Jours +3 Jours rotation échafaudage




SUD 2 OUEST 2

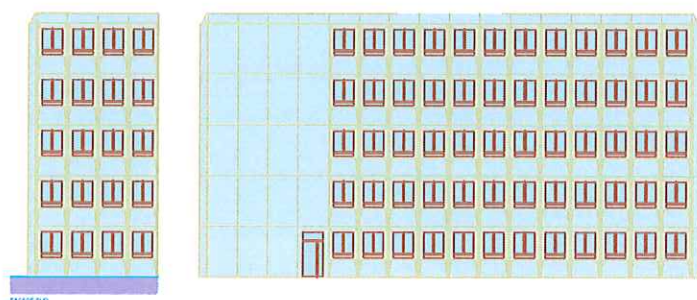


PHASE 3: 81 Jours +3 Jours rotation échafaudage




NORD 1

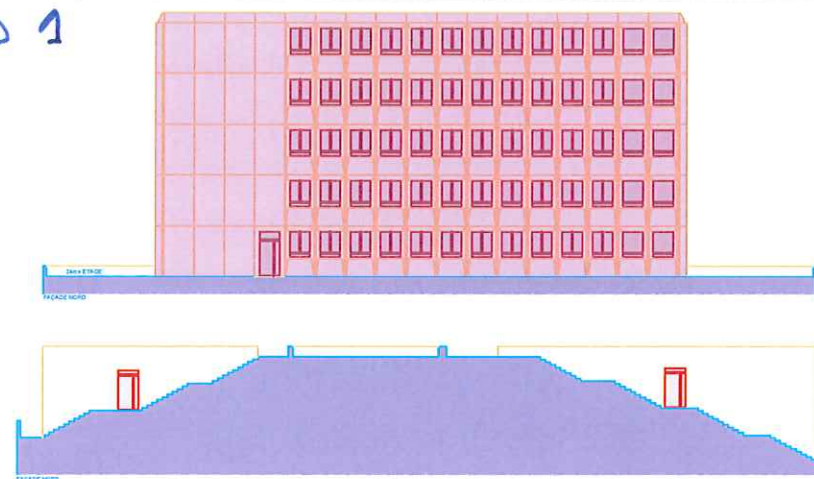


PHASE 4: 72 Jours +3 Jours rotation échafaudage



EST 2

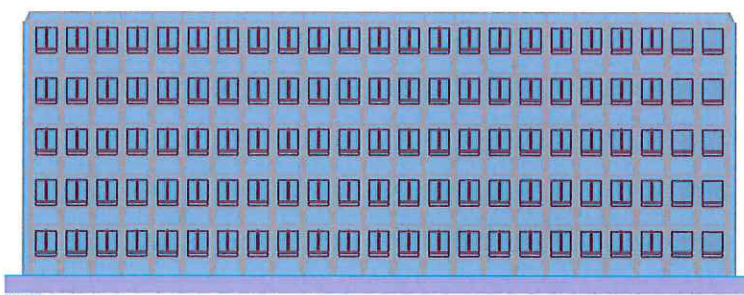

PHASE 5: 90 Jours +3 Jours rotation échafaudage



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET
DES FINANCES
Service des affaires financières et immobilières
Bureau Gestion et Expertise Immobilière Ministérielle
Bâtiment "le Valmy"
18, avenue Léon Gaumont
75977 Paris Cedex 20

BUREAU D'ÉTUDE
ASTER BTP
Les roses d'Azur 83
35, avenue Sainte Marguerite
06200 Nice

BUREAU D'ÉTUDE
CHEMIN DE FONT SERAINE
Le GRAND BOSQUET - BAT. A
13420 GEMENOS
Téléphone : 04. 42. 18. 62. 45
Télécopie : 04. 42. 70. 09. 13
Email : contact@st-ingenierie.com


CENTRE DES FINANCE PUBLIC - NICE CADEI

1

Echelle :

FEVRIER
2018











ROTATION ECHAFAUDAGE



S.T. Ingénierie

PRO

N° Aff : D171518

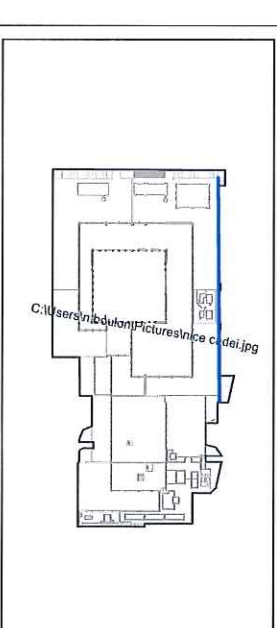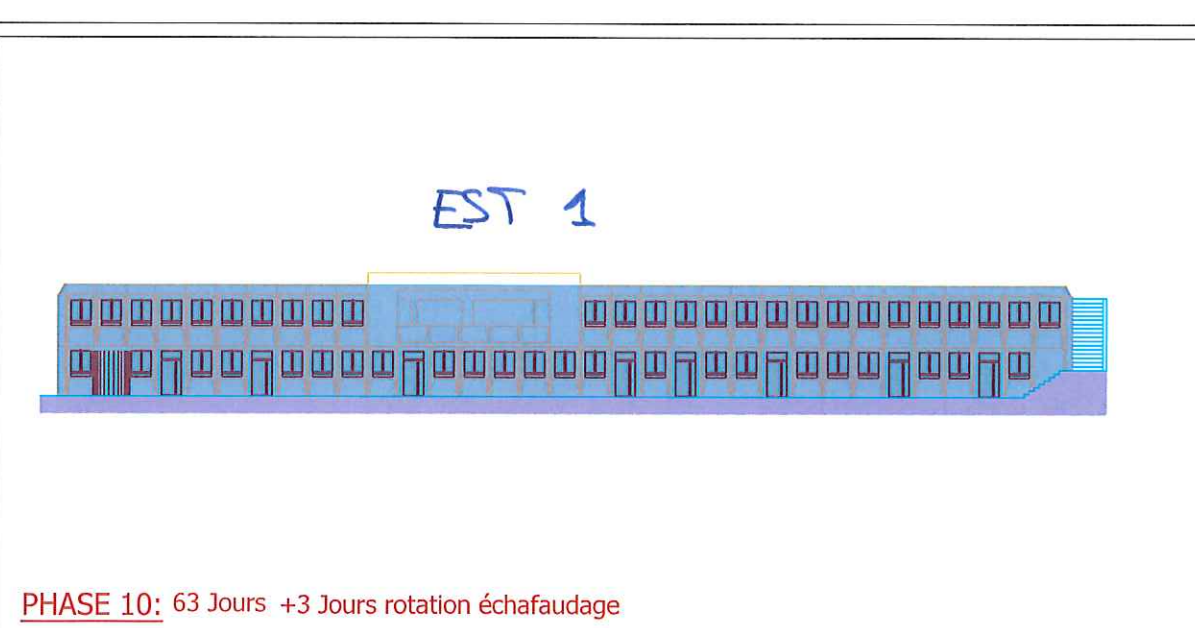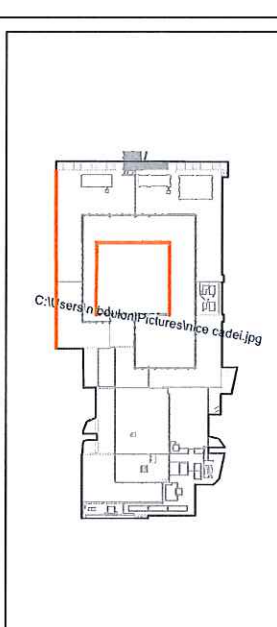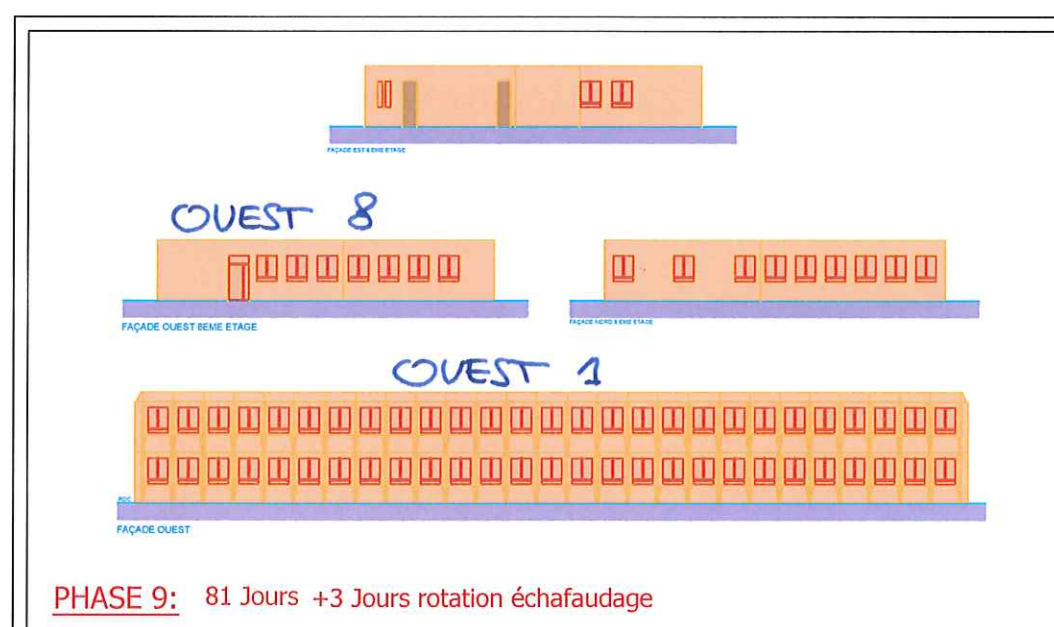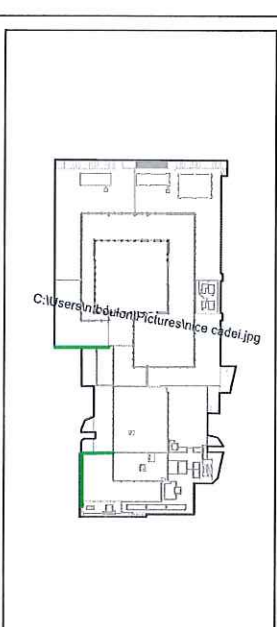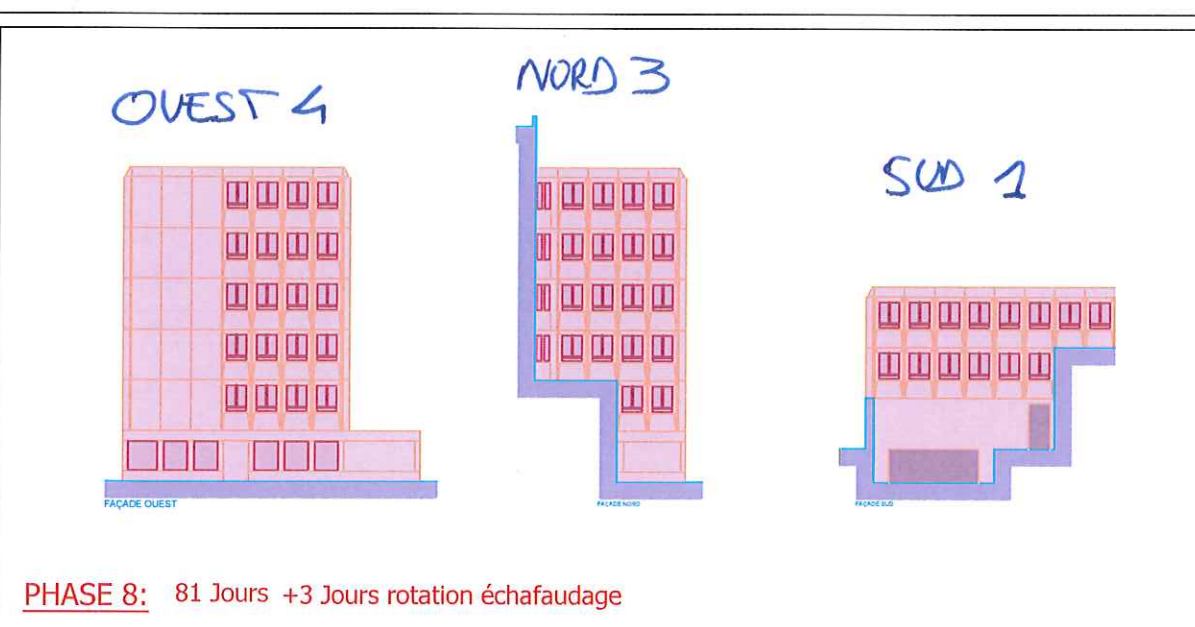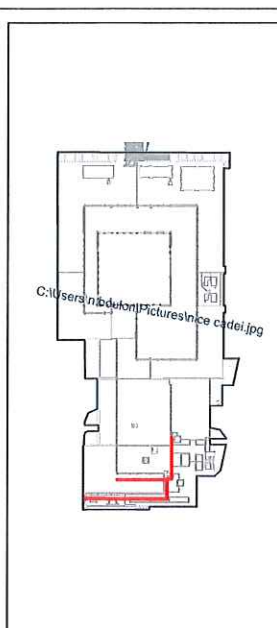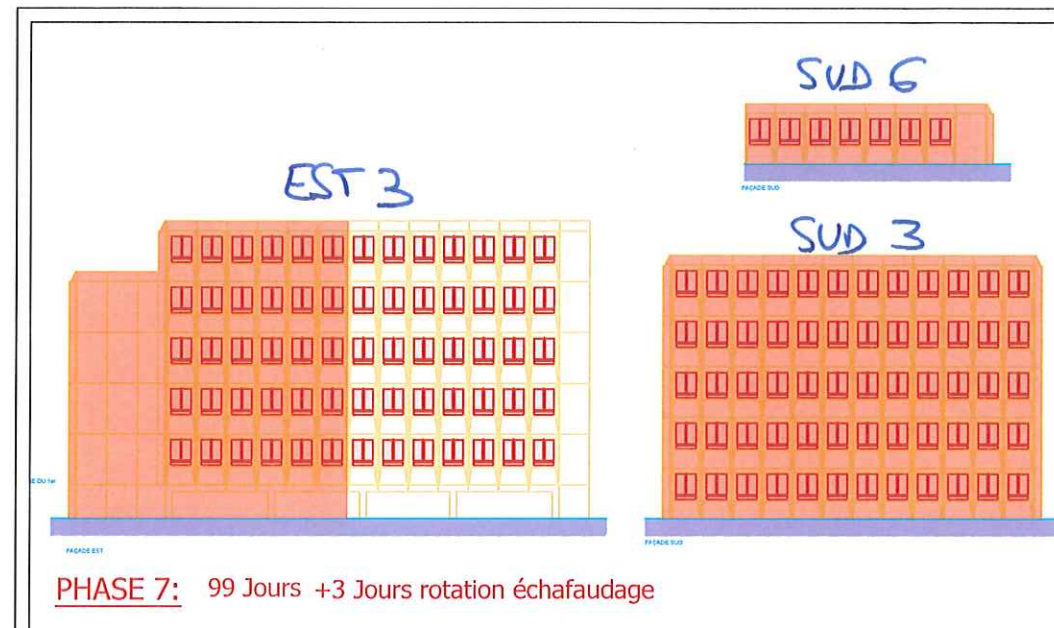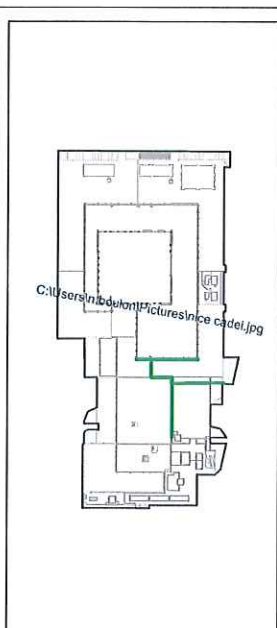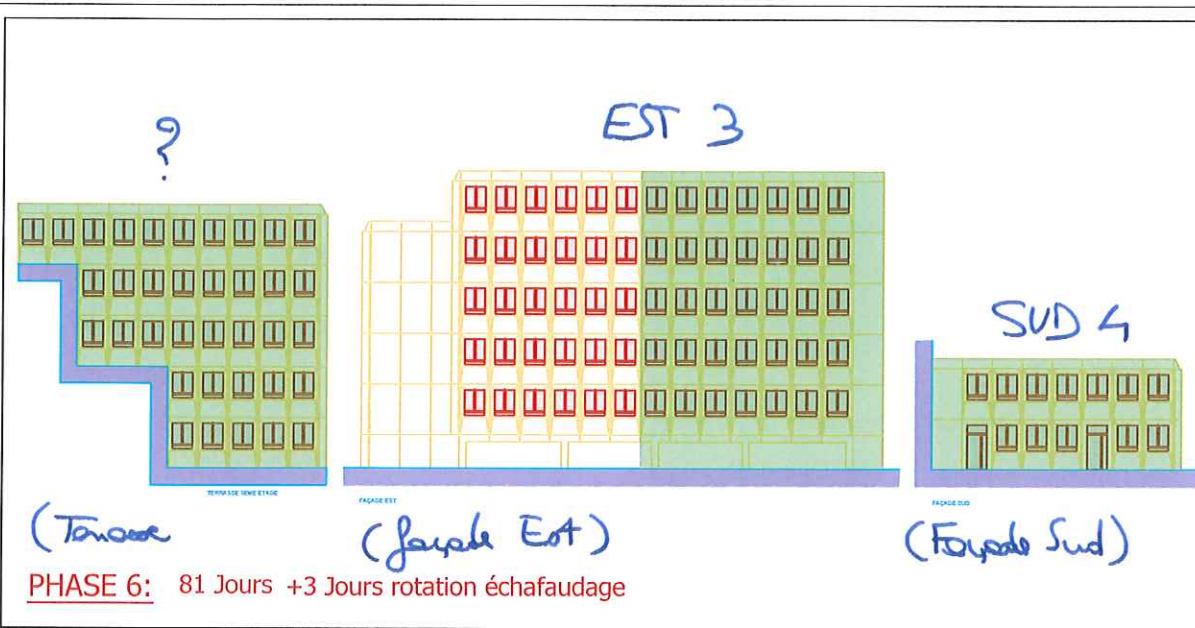

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Service des affaires financières et immobilières Bureau Gestion et Expertise Immobilière Ministérielle Bâtiment "Le Valmy" 18, avenue Léon Gaumont 75977 Paris Cedex 20		CENTRE DES FINANCE PUBLIC - NICE CADEI	
BUREAU D'ETUDE ASTER BTP Les roses d'Azur 83 35, avenue Sainte Marguerite 06200 Nice		2	ROTATION ECHAFAUDAGE
BUREAU D'ETUDE CHEMIN DE FONT SERAINE Le GRAND BOSQUET - BAT. A 13420 GEMENOS Téléphone : 04. 42. 18. 62. 45 Télécopie : 04. 42. 70. 09. 13 Email : contact@st-ingenierie.com		Echelle : FEVRIER 2018	PRO
		N° Aff : D171518	
